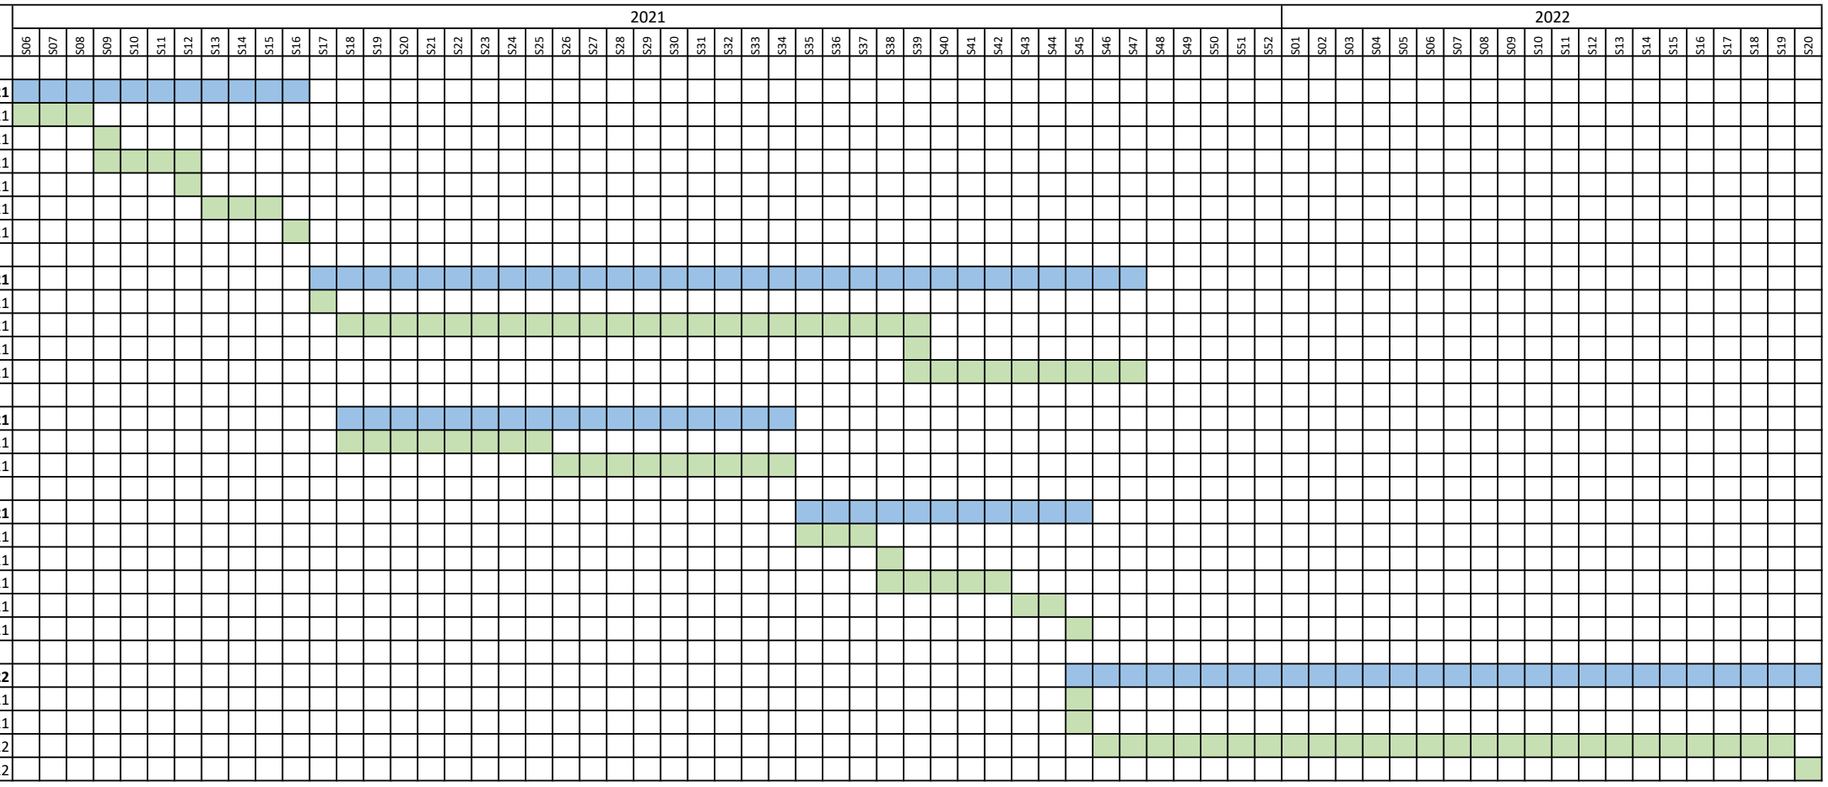Nom de la tâche	Début	Fin
ESQUISSES ET AVANT PROJET	**08/02/2021**	**23/04/2021**
Etudes d'esquisses	08/02/2021	28/02/2021
Validation études d'esquisses	01/03/2021	03/03/2021
Avant-Projet Sommaire	03/03/2021	25/03/2021
Validation APS	25/03/2021	29/03/2021
Avant-Projet Définitif	30/03/2021	18/04/2021
Validation APD - Présentation CM 19/04/2021	19/04/2021	23/04/2021
PERMIS DE CONSTRUIRE	**23/04/2021**	**30/11/2021**
Constitution et dépôt du dossier de demande	23/04/2021	30/04/2021
Instruction de la demande (5 mois)	30/04/2021	30/09/2021
Obtention du permis de construire	30/09/2021	30/09/2021
Délais de recours des tiers	30/09/2021	30/11/2021
ETUDES DE PROJET	**30/04/2021**	**14/06/2021**
Etudes de projet + validation	30/04/2021	15/06/2021
Etudes du DCE + validation	28/06/2021	31/08/2021
APPELS D'OFFRES TRAVAUX	**01/09/2021**	**08/11/2021**
Rédaction et constitution du DCE	01/09/2021	17/09/2021
Parution de l'appel d'offres	22/09/2021	22/09/2021
Réception des offres	22/09/2021	22/10/2021
CAO (études des offres, négociations)	23/10/2021	05/11/2021
Attribution du marché public travaux	08/11/2021	08/11/2021
REALISATION	**09/11/2021**	**16/05/2022**
OS Commencement de travaux	09/11/2021	09/11/2021
Préparation de chantier	09/11/2021	15/11/2021
Démarrage des travaux	15/11/2021	15/05/2022
Réception des ouvrages	16/05/2022	16/05/2022
